# Ingeniería de Software

# Gestión de la Configuración (CM)

Definición de un Proceso de Control del Cambio

### **MIEMBROS DEL GRUPO 5:**

- Hugo Carreira Rial
- Iñaki Dueñas Otero
- María Lima Pazo
- Nerea Nieto Pedrares

FECHA DE ENTREGA: 12/2/2016

NOTA EQUIPO 5: Con el fin de mantener la claridad del documento, la evaluación de la propuesta de cambios se incluirá al final del documento organizada en una tabla. Ir a la página 19 para ver.

CONTROL DE VERSIONES		
VERSION	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1.0	29/01/2024	Realización del documento

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

## ÍNDICE

1	INF	ORMAC	IÓN SOBRE LA PRÁCTICA A REALIZAR	]
	1.1	DESCR	IPCIÓN DE LA PRÁCTICA	. 1
			IPCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO	
			MIENTO DE LA PRÁCTICA	
2			NTACIÓN DE LA PRÁCTICA	
4				
			IPCIÓN DEL PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS	
			AMA DE ACTIVIDADES	
	2.3		ICIÓN DE ACTIVIDADES	
		2.3.1	ACTIVIDAD PROPOSICIÓN DE UN CAMBIO POR EL USUARIO	2
		2.3.2		
			ROLLADOR	
			ACTIVIDAD EVALUACIÓN DEL INFORME POR EL RESPONSABLE DEL	
			OL	
			ACTIVIDAD RECHAZAR LA PROPUESTA	
		2.3.5	ACTIVIDAD INFORMAR AL USUARIO	
		2.3.6	ACTIVIDAD AÑADIR A LA COLA Y GENERAR EL OCI	4
		2.3.7	ACTIVIDAD ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE OBJETOS DE	
		CONFIG	GURACIÓN	
		2.3.8		
			ACTIVIDAD REVISIÓN DEL DESARROLLO	
		2.3.10		
		2.3.11		
		2.3.12		7
	2.4		ILLAS DEL PROCESO	
			PLANTILLA PROPOSICIÓN DEL CAMBIO	
			PLANTILLA INFORME DEL CAMBIO	
		2.4.3	PLANTILLA DECISIÓN TRAS EVALUACIÓN	8
		2.4.4	PLANTILLA ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE OBJETOS DE	
			GURACIÓN	
			PLANTILLA DESARROLLO DEL CAMBIO 1	
			PLANTILLA REVISIÓN DEL CAMBIO 1	
		2.4.7	PLANTILLA REALIZACIÓN DEL TESTEADO	
		2.4.8	PLANTILLA INCLUSIÓN DEL CAMBIO EN LA NUEVA VERSIÓN 1	
		2.4.9	PLANTILLA DISTRIBUCIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN 1	[2
		2.4.10	PLANTILLA INFORMAR AL USUARIO 1	12
3	AN	EXOS.		[4
	3 1	ANEXO	1 CAMBIOS PROPUESTOS POR CADA MIEMBRO DEL GRUPO 1	4
			2 BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL UTILIZADO 1	
			3 RELATORIO DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A ÉSTE; ERRO!	
			R NO DEFINIDO.	
	T - T - T			

05/02/2024 i

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

05/02/2024 ii

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

## 1 Información sobre la práctica a realizar

### 1.1 Descripción de la práctica

En esta práctica se pretende definir el proceso de control de cambios a lo largo del proyecto a desarrollar. Por lo tanto, se define cada actividad exhaustivamente y se crean las plantillas correspondientes para poder llevar a cabo su definición, seguimiento y control posterior. De momento tan solo se realizará lo antes mencionado de forma genérica.

## 1.2 Descripción del grupo de trabajo

El grupo que desarrolla la práctica en el grupo 5 de las clases interactivas del grupo 2. El equipo está compuesto por:

- Hugo Carreira Rial: Gestor Documental

- Iñaki Dueñas Otero: Validadora de Requisitos

Nerea Nieto Pedrares: Jefa de Proyecto
 María Lima Pazo: Gestora de Cambios

## 1.3 Seguimiento de la práctica

Durante la sesión del lunes 29 de enero, todos los integrantes del grupo realizaron el diagrama de actividades en conjunto, además de organizar ciertos aspectos de la práctica. A lo largo de la semana se han ido realizando reuniones (3 en total), en ellas se ha dividido equitativamente el trabajo.

Durante la sesión del lunes 29 de enero, todos los integrantes del grupo realizaron el diagrama de actividades en conjunto, además de organizar ciertos aspectos de la práctica. A lo largo de la semana se han ido realizando reuniones (3 en total), en ellas se ha dividido equitativamente

05/02/2024 Página 1 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

## 2 DOCUMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA

## 2.1 Descripción del proceso de control de cambios

### 2.2 Diagrama de actividades

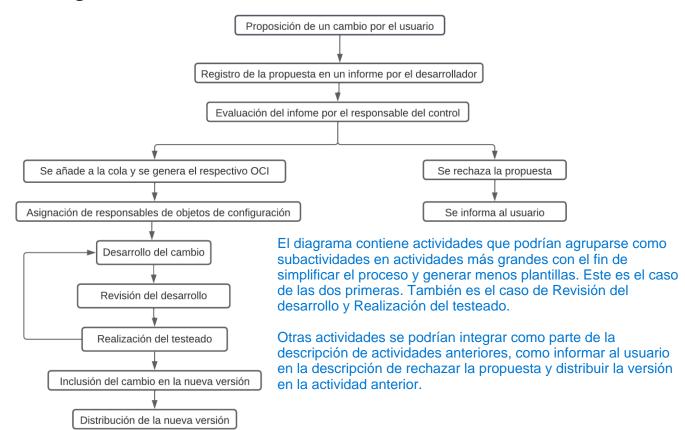


Ilustración 1. Diagrama de actividades

## 2.3 Definición de Actividades

### 2.3.1 Actividad Proposición de un cambio por el usuario

- **Descripción:** El usuario considera que alguna función o requisito mejorará el proyecto. Por lo tanto, escribe a los responsables para presentar y explicar de forma proposición. Incompleto?

Podría ser

- Involucrados: Usuario autorizado a los archivos del proyecto que propone un cambio. cualquier
- Entradas requeridas: Un correo electrónico o carta notificando la proposición del interesado. cambio, así como los motivos asociados a esa decisión. Plantilla "proposición del cambio" disponible en la carpeta "plantillas".
- **Productos de trabajo:** Plantilla "proposición del cambio" en blanco disponible en la En blanco? carpeta "plantillas/propuesta". Productos de trabajo hace referencia a las salidas

05/02/2024 Página 2 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

- **Criterios de entrada:** Llegada de un correo electrónico o una carta, por lo que aún no ha sido analizada ni gestionada.
- Criterios de salida: Los campos de la plantilla "proposición del cambio" están debidamente escritos.
- Subactividades: No hay.

## 2.3.2 Actividad Registro de la propuesta en un informe por el desarrollador

- **Descripción:** El desarrollador analiza detalladamente la propuesta del usuario, recogida en la plantilla "proposición del cambio", prestando especial atención a los detalles técnicos. Toda esta información será recogida en un informe, que realizará con la función de ayudar a los responsables de control a llevar a cabo una decisión mucho más informada y precisa acerca de los cambios propuestos.
- Involucrados: El desarrollador del proyecto, encargado de analizar las proposiciones.
- **Entradas requeridas**: Plantilla "proposición del cambio" cubierta en la carpeta "plantillas".
- Productos de trabajo: Plantilla "informe del cambio" cubierta.
- **Criterios de entrada:** En la carpeta "plantillas/propuesta" encontrar una nueva petición de cambio no gestionada.
- Criterios de salida: Los campos de la plantilla "informe del cambio" están debidamente escritos.
- **Subactividades:** No hay.

## 2.3.3 Actividad Evaluación del informe por el responsable del control

- **Descripción:** Dado el informe realizado por el desarrollador (la plantilla "informe del cambio"), los responsables del control analizan los puntos positivos y negativos partiendo de esa plantilla. Si la decisión es aceptar el cambio, la siguiente actividad será añadir a la cola y generar el OCI. De caso contrario se pasa a la actividad rechazar la propuesta.

  En la descripción, falta analizar el cambio económica y temporalmente.
- **Involucrados:** Personal responsable de evaluar el informe y tomar la decisión (gestores, analistas, ...)
- **Entradas requeridas:** Plantilla "informe del cambio" en la carpeta "plantilla/propuesta" debidamente cubierta.
- **Productos de trabajo:** Plantilla "decisión tras evaluación" cubierta, reflejando la decisión tomada.
- Criterios de entrada: Plantilla "informe del cambio" sin haber sido analizada y evaluada
- Criterios de salida: Los campos de la plantilla "decisión tras evaluación" están debidamente escritos.
- **Subactividades:** No hay.

### 2.3.4 Actividad Rechazar la propuesta

- **Descripción:** Si una propuesta de cambio no cumple los estándares definidos previamente (es decir, que los responsables de la evaluación deciden no implementar esa proposición de cambio), se rechazará la propuesta.

05/02/2024 Página 3 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP ControldeCambios Grupo5-	v1

- Involucrados: Los responsables del control, que deciden que propuestas aceptar o rechazar.
- Entradas requeridas: Plantilla "decisión tras evaluación" cubierta, en la cual el cambio aparece denegado, en la carpeta plantillas... ?
- **Productos de trabajo:** Informe en que se especifica todo el proceso y la justificación de la decisión de ser rechazada. Falta la ubicación de la plantilla
- Criterios de entrada: La plantilla "decisión tras evaluación" debe estar debidamente cubierta.
- **Criterios de salida:** Se envía, mediante el mismo medio de recepción de la propuesta, el informe y la plantilla "decisión tras la evaluación". Se informa en la siguiente actividad?
- **Subactividades:** No hay.

La actividad Informar usuario se puede incluir en esta

### 2.3.5 Actividad Informar al usuario

- **Descripción:** Si una propuesta de cambio se rechaza, se informará al usuario de la toma de dicha decisión, acompañado de una pequeña explicación del porqué de esta.
- Involucrados: Usuario proponedor del cambio, Desarrollador del proyecto.
- Entradas requeridas: Evaluación del informe de desarrollo con el rechazo del cambio como resultado.
- **Productos de trabajo**: Notificación informativa del rechazo del cambio propuesto.
- **Criterios de entrada:** La evaluación del informe de viabilidad del cambio ha finalizado con la conclusión de rechazar el cambio propuesto.
- Criterios de salida: La notificación ha sido enviada correctamente al usuario proponedor del cambio rechazado.
- Subactividades: No hay.

### 2.3.6 Actividad Añadir a la cola y generar el OCI

- **Descripción:** Se añade a la cola de prioridad el cambio a implementar, asignándole una prioridad en función de la evaluación del informe realizado sobre dicho cambio. Se deberá asignar una prioridad más alta aquellos cambios que tengan mejor Incompleto
- Involucrados: Evaluador del informe.
- Entradas requeridas: Evaluación del informe de desarrollo con la aceptación del cambio como resultado.
- Productos de trabajo: Cola de prioridades. Inserción del cambio a la cola?
- **Criterios de entrada:** La evaluación del informe de viabilidad del cambio ha finalizado con la conclusión de aceptar el cambio propuesto.
- **Criterios de salida:** El cambio se añade a la cola con la prioridad establecida a partir de la evaluación del informé y se genera el OCI.
- Subactividades: Añadir a la cola y Generar el OCI.

## 2.3.6.1 Subactividad Añadir cambio a la cola Se podría agrupar como descripción de la anterior

- **Descripción:** Se añade a la cola de prioridad el cambio a implementar, asignándole una prioridad en función de la evaluación del informe realizado sobre dicho cambio para comenzar con él en cuanto se considere oportuno en función del resultado de la evaluación.
- Involucrados: Evaluador del informe.

05/02/2024 Página 4 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

- Entradas requeridas: Evaluación del informe de desarrollo con la aceptación del cambio como resultado.
- **Productos de trabajo:** Cola de prioridades.
- **Criterios de entrada**: La evaluación del informe de viabilidad del cambio ha finalizado con la conclusión de aceptar el cambio propuesto.
- **Criterios de salida:** El cambio se añade a la cola con la prioridad establecida a partir de la evaluación del informe.

### 2.3.6.2 Subactividad Generar el OCI Se podría agrupar como descripción de la anterior

- **Descripción:** Para un cambio aprobado, se genera una Orden de Cambio de Ingeniería (OCI) que lo describa. En ella se debe definir el cambio a realizar, sus restricciones y sus criterios de revisión y auditoría.
- Involucrados: Evaluador del informe.
- Entradas requeridas: Evaluación del informe de desarrollo con la aceptación del cambio como resultado.
- Productos de trabajo: OCI
- Criterios de entrada: La evaluación del informe de viabilidad del cambio ha finalizado con la conclusión de aceptar el cambio propuesto.
- Criterios de salida: El OCI finalizado refleja las características del cambio propuesto.

## 2.3.7 Actividad Asignación de responsables de objetos de configuración

Clasificación de la actividad

- **Descripción:** Se asigna el personal responsable del desarrollo de cada objeto de configuración relacionado con el cambio a llevar a cabo.
- Involucrados: Equipo de desarrollo.
- Entradas requeridas: OCI generado correctamente.

Ubicación de la

- Productos de trabajo: Documento de asignación de objetos de configuración. plantilla?
- Criterios de entrada: Se ha acabado de desarrollar el cambio anterior y ya se ha distribuido y el cambio es el primero en la cola de desarrollo.
- **Criterios de salida:** Cierto personal del equipo de desarrollo tiene asignada la tarea de llevar a cabo los objetos de configuración. Debería de haber una plantilla con la asignación

- **Subactividades:** No hay. debidamente cubierta

### 2.3.8 Actividad Desarrollo del cambio

- **Descripción:** Para llevar a cabo la nueva versión ya aceptada, ha de ser necesario desarrollar el cambio propuesto.
- Involucrados: Equipo de desarrollo.
- Entradas requeridas: Documento de asignación de objetos de configuración.
- **Productos de trabajo:** Nuevo cambio desarrollado y preparado para ser testeado.
- Criterios de entrada: Se ha finalizado la asignación de los objetos de configuración.
- Criterios de salida: El cambio propuesto está preparado para ser testeado.

- Subactividades: No hay.

05/02/2024 Página 5 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 2.3.9 Actividad Revisión del desarrollo

- **Descripción:** Revisión del desarrollo realizado para encontrar posibles errores a simple vista con anterioridad al testeado de este.
- Involucrados: Equipo de desarrollo.
- Entradas requeridas: Desarrollo del cambio.
- **Productos de trabajo:** Desarrollo del cambio corrigiendo posibles errores detectados en el proceso de revisión, plantilla Revisión del cambio.
- Criterios de entrada: Se ha completado el proceso de desarrollo.
- Criterios de salida: Se han corregido los fallos detectados una vez visualizado con detención el código y se ha cubierto correctamente la plantilla Revisión del cambio disponible en la carpeta "Plantillas".
- Subactividades: No hay.

La revisión y el testeo se pueden unificar en una única actividad

### 2.3.10 Actividad Realización del testeado.

- **Descripción:** Para la posterior inclusión del cambio en una nueva versión, se ha de realizar un testeado exhaustivo del cambio ya traducido a código. Si se comprueba que existe algún error, se retrocederá para subsanar dicho error.
- Involucrados: Equipo de pruebas y desarrollo.
- Entradas requeridas: Para el testeo del cambio se ha de tener desarrollado el nuevo cambio.
- **Productos de trabajo:** El resultado del trabajo consistirá en una validación positiva del cambio o negativa que conllevará a un nuevo estado de desarrollo y revisión del cambio, plantilla Revisión del testeado.
- Criterios de entrada: Versión revisada y desarrollada del cambio propuesto.
- Criterios de salida: Si el cambio realizado supera las pruebas de testeo, se propone incluirlo en la nueva versión, sin embargo, si falla, se tendrá que retroceder a la etapa de desarrollo del cambio, plantilla Realización del testeado disponible en la carpeta "Plantillas" correctamente cubierta.
- Subactividades: No hay.

### 2.3.11 Actividad Inclusión del cambio en la nueva versión

- **Descripción:** Consiste en generar una nueva versión en la que se incluya el nuevo cambio que se ha planteado.
- **Involucrados:** Desarrolladores y personal con conocimientos habilitantes capaces de realizar dicho cambio.
- **Entradas requeridas:** Planificación del cambio y memoria del proceso de cambio que se va a introducir de forma detallada.
- **Productos de trabajo:** Nueva versión del software desarrollado, plantilla Inclusión del cambio en la nueva versión.
- **Criterios de entrada:** Una vez asegurados los criterios de calidad procedentes del testeado y tras asegurar de que no existen errores en la nueva versión, se propone que se incorpore el nuevo cambio al previamente existente.
- Criterios de salida: Versión nueva del software que incluye el cambio propuesto y plantilla Inclusión del cambio en la nueva versión disponible en la carpeta "Plantillas" correctamente cubierto.

05/02/2024 Página 6 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

- Subactividades: No hay.

#### 2.3.12 Actividad Distribución de la nueva versión

- **Descripción:** Tras la inclusión del cambio en la nueva versión se distribuye a los usuarios la nueva versión, en la que estará presente el cambio propuesto.
- Involucrados: Desarrolladores y plataforma que aloja la aplicación.
- Entradas requeridas: Versión en la que se incluya el nuevo cambio.
- **Productos de trabajo:** Lanzamiento a todos los usuarios de la nueva versión en la que está el nuevo cambio o modificación propuesto, plantilla Distribución de la Nueva Versión.
- Criterios de entrada: La versión resultante de incluir el cambio se debe adaptar a los medios en los que se a lanzar y debe de ser compatible con los mismos.
- **Criterios de salida**: Se informa a los usuarios de la disponibilidad de una nueva versión y se ha cubierto correctamente la plantilla Distribución de la Nueva Versión disponible en la carpeta "Plantillas".
- Subactividades: No hay.

Se puede incluir en la Inclusión del cambio en la nueva versión

Falta indicar dónde se almacena la plantilla cubierta

### 2.4 Plantillas del proceso

No queda claro si el valor ID se refiere a cada documento o al cambio que se está tratando

### 2.4.1 Plantilla proposición del cambio

Plantilla usada por aquellos usuarios que, dadas las circunstancias, desean proponer un cambio a los responsables del proyecto. Se envía o por carta o por correo electrónico.

### 2.4.1.1 Modelo

Id:	Fecha:
Nombre:	
Correo electrónico:	Dirección postal:
Descripción:	
PROPOSICIÓ	N DE CAMBIOS
Página nº página ac	etual / nº páginas total

## 2.4.1.2 Justificación de sus campos

- **a. Fecha:** formato día/mes/año (automático)
- **b. Identificador:** identificador (automático)
- c. Nombre: nombre de la persona que propone el cambio
- **d.** Correo electrónico: si la petición es enviada por correo, se almacena (si no, se marca con una línea '-', indicando que el campo está cubierto)
- **e. Dirección postal:** si la petición es enviada por carta (o correspondencia) se almacena, si no se marca con '-'.

05/02/2024 Página 7 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

**e. Descripción:** explicación de la propuesta de cambio, así como la situación en la que ha sido detectada y argumentos para justificarla.

### 2.4.2 Plantilla informe del cambio

Plantilla usada por el desarrollador. A partir de la plantilla "proposición del cambio", se crea esta, dónde se incluye una especificación y análisis detallado (con el fin de facilitar la decisión posterior).

### 2.4.2.1 Modelo

Id:	Fecha:		
Nombre:			
Correo electrónico:	Dirección postal:		
Descripción:			
Justificación:			
Influencia:			
INFORME I	INFORME DEL CAMBIO		
Página nº página actual / nº páginas total			

## 2.4.2.2 Justificación de sus campos

- **a. Fecha:** formato día/mes/año (automático)
- b. Identificador: identificador (automático)
- c. Nombre: nombre de la persona que propone el cambio
- **d.** Correo electrónico: si la petición es enviada por correo, se almacena (si no, se marca con una línea '-', indicando que el campo está cubierto)
- **e. Dirección postal:** si la petición es enviada por carta (o correspondencia) se almacena, si no se marca con '-'.
- e. Descripción: explicación de la propuesta de cambio en detalle.
- **f. Justificación:** especifica la justificación del usuario, añadiendo la opinión subjetiva del desarrollador.
- **g. Influencia:** describe aquel punto del proyecto que pueda verse afectado por el cambio propuesta.

Incluír el nombre o ID del desarrollador que efectúa las revisiones de cara al seguimiento

### 2.4.3 Plantilla decisión tras evaluación

Plantilla cubierta por los responsables de control, aquellos que toman la decisión de aceptar o rechazar la propuesta de cambio. Se parte de la plantilla "informe del cambio" para rellenarla.

05/02/2024 Página 8 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 2.4.3.1 Modelo

Id:	Fecha:	
Nombre:		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	DECISIÓN	
	Aceptar/Rechazar	
DECISIÓN TRAS EVALUACIÓN		
Página nº página actual / nº páginas total		

### 2.4.3.2 Justificación de sus campos

- a. Fecha: formato día/mes/año (automático)
- **b. Identificador:** identificador (automático)
- c. Nombre: nombre del equipo responsable de la decisión.
- **d. Descripción del cambio:** descripción identificativa del cambio sobre el que se ha tomado la decisión.
- e. Decisión: resultado de la decisión: aceptar o rechazar.

# 2.4.4 Plantilla Asignación de Responsables de Objetos de Configuración

Plantilla cubierta por el equipo después de asignar los responsables de objetos de configuración para registrar la decisión.

### 2.4.4.1 Modelo

Id:	Fecha:
Non	nbre:
	Asignación de responsabilidades
AS	SIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE OBJETOS DE CONFIGURACIÓN
	Página nº página actual / nº páginas total

## 2.4.4.2 Justificación de sus campos

a. Fecha: formato día/mes/año (automático)b. Identificador: identificador (automático)

c. Nombre: nombre del responsable de cubrir la plantilla

05/02/2024 Página 9 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

**d. Asignación de responsabilidades:** Se asocia cada persona con sus responsabilidades de objetos de configuración.

### 2.4.5 Plantilla Desarrollo del Cambio

Plantilla cubierta por las personas encargadas de realizar y/o implementar los cambios necesarios para dar cobertura a la nueva propuesta de cambio.

### 2.4.5.1 Modelo

Id:	Fecha Inicio:	Fecha Fin:		
Nombre de los desarrolladores:				
Registro de versionado	Desarrollador asociado a la modificación			
DESARROLLO DEL CAMBIO				
Página nº página actual / nº páginas total				

### 2.4.5.2 Justificación de sus campos

- **e. Fecha Inicio y Fin:** fecha en la que se inician los trabajos de desarrollo del cambio (automático cuando se le da entrada) y fecha final cuando el cambio se encuentra implementado.
- **f. Identificador:** identificador (automático)
- **g.** Nombre de los desarrolladores: Nombre de los desarrolladores que participan en el conjunto del proceso.
- h. **Registro de versionado:** Se han de indicar todas las versiones, indicando los cambios en cada una de ellas respecto a la anterior.
- i. **Desarrollador asociado a la modificación:** Para cada uno de las versiones se ha de indicar, quienes del conjunto de desarrolladores ha participado.

Referenciar ID del cambio original propuesto

### 2.4.6 Plantilla Revisión del cambio

Plantilla cubierta por la persona encargada de supervisar los cambios realizados.

### **2.4.6.1** Modelo

Id: Fecha Supervisión:		
Nombre del supervisor:	Versión:	
Defecto	s encontrados:	
REVISIÓN DEL CAMBIO		
Página nº página actual / nº páginas total		

05/02/2024 Página 10 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 2.4.6.2 Justificación de sus campos

a. Fecha supervisión: Fecha en la que se inician los Incompleto

**b.** Identificador: identificador (automático)

c. Nombre del supervisor: Nombre del supervisor del cambio.

**d.** Versión: Versión sobre la que se está tratando el defecto encontrado.

**e. Defectos encontrados:** Errores o posibles fallos anticipados que puedan observarse durante esta fase y que se corregirán a posteriori de su detección.

Referencia el cambio que causa el defecto

### 2.4.7 Plantilla Realización del testeado.

Plantilla cubierta por el personal encargado de testear la nueva funcionalidad o cambio propuesto.

### 2.4.7.1 Modelo

Id:		Fecha del testeado:
Apto:	No Apto:	Versión del testeado:
	Fallo enc	contrado:
	REALIZACIÓN I	DEL TESTEADO
	Página nº página act	ual / nº páginas total

## 2.4.7.2 Justificación de sus campos

- a. Fecha del testeado: Fecha en la que se realiza el testeado.
- **b. Identificador:** Identificador (automático)
- c. Apto / no apto: Marcar con una cruz si se superan, o no, las pruebas con éxito.
- **d.** Versión del testeado: Si existen varios testers, se ha de indicar en este campo el identificador del test en concreto que se ha ejecutado en ese caso.
- **e. Fallos encontrados:** Errores que inducen un fallo en el sistema lo que conllevaría, de manera automática un no apto en la casilla correspondiente.

### 2.4.8 Plantilla Inclusión del cambio en la nueva versión.

Plantilla cubierta por el personal encargado de testear la nueva funcionalidad o cambio propuesto.

05/02/2024 Página 11 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 2.4.8.1 Modelo

Id:	Fecha inicio:	Fecha fin:
Versión cambio:	Versión:	
Detalles de	estacables	
INCLUSIÓN DEL CAMBIO	EN LA NUEVA VER	RSIÓN
Página nº página actu	ıal / nº páginas total	

### 2.4.8.2 Justificación de sus campos

- **a.** Fecha inicio y fin: Fecha en la que se inicia la inclusión del cambio en la nueva versión y fecha fin en la cual finalizaría la integración de ambas.
- **b. Identificador:** Identificador (automático)
- **c. Versión cambio:** Versión del cambio el cual se va a integrar sobre la versión del programa.
- **d. Versión:** Versión del programa en el que se a introducir el cambio.
- **e. Diario de integración de la nueva versión:** Errores que inducen un fallo en el sistema lo que conllevaría, de manera automática un no apto en la casilla correspondiente.

### 2.4.9 Plantilla Distribución de la nueva versión.

Plantilla cubierta por el equipo encargado de la distribución

### 2.4.9.1 Modelo

Id:	Fecha lanzamiento:
Versión lanzamiento:	Soporte:
LANZAMIENTO DE LA NUEVA VERSIÓN	
Página nº página actual / nº páginas total	

### 2.4.9.2 Justificación de sus campos

- a. Fecha lanzamiento: Fecha en la cual se podrá obtener por el público objecto.
- **b. Identificador:** Identificador (automático)
- **c. Versión lanzamiento:** Nombre que recibe la versión que es lanzada, normalmente sería lógico que fuese consecutiva a la anterior lanzada.
- **d. Soporte:** Plataformas en las que se lanza.

### 2.4.10 Plantilla Informar al usuario.

Plantilla cubierta por el responsable de control que descarta la propuesta de cambio.

05/02/2024 Página 12 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 2.4.10.1 Modelo

Id:	Fecha:
Nombre:	Correo-E:
Motivo del	rechazo
INFORMAR AL USUARIO	
Página nº página actual / nº páginas total	

## 2.4.10.2 Justificación de sus campos

- **a. Fecha:** Fecha en la cual se le notifica al usuario la resolución negativa de su propuesta.
- **b. Identificador:** Identificador (automático)
- c. Nombre: Nombre de la persona a la cual se le es notificada la resolución.
- d. Correo-E: Contacto a la cual se le enviará la resolución.
- e. Motivo: Justificación del motivo de que su propuesta sea denegada.

05/02/2024 Página 13 de 18

<b>ENSO</b>	CM. Definición de un Proceso de Control del Cambio	Grp: 5
GrEI	Doc.: DP_ControldeCambios_Grupo5-	v1

### 3 ANEXOS

### 3.1 Anexo 1.- Cambios propuestos por cada miembro del grupo

### 3.1.1 Hugo

- Un requisito funcional: Extender una funcionalidad que permita el envío de localización en tiempo real de un usuario que pertenece a un grupo
- Un requisito no funcional: Extender la compatibilidad con otro sistema operativo nuevo.
- Un problema en los documentos de la línea base: En el caso de pagos seguros existe un requisito mal descrito ya que es una restricción sobre un propio requisito funcional.

#### 3.1.2 Iñaki

- Un requisito funcional: Seguridad y privacidad en el flujo de comunicación de los usuarios: cifrado de los chats de los grupos de gastos para aumentar la privacidad de los usuarios.
- Un requisito no funcional: Programación de actividades: añadir la funcionalidad de crear actividades programadas para el grupo de gastos.
- Un problema en los documentos de la línea base: Los valores establecidos a los diferentes requisitos no son correctos, se le dio mayor valor a algunos que no suponen un aumento de capital para la empresa y viceversa.

### 3.1.3 Nerea

- Un requisito funcional: proporcionar la opción de configurar los ajustes de privacidad.
- Un requisito no funcional: precisión en los cálculos en los gastos.
- Un problema en los documentos de la línea de base: el requisito de intercambio de mensajes no está justificado en una necesidad.

#### 3.1.4 María

- Un requisito funcional: Permitir la edición de una reseña publicada por un usuario.
- Un requisito no funcional: Encriptación de la base de datos y la copia de seguridad
- Un problema en los documentos de la línea base: El caso de uso "Puntuar actividades" no está correctamente definido: falta especificación (buscar actividad, cuándo se permite puntuarla)

## 3.2 Anexo 2.- Bibliografía y material utilizado

Durante la práctica se ha utilizado:

[1] Universidad de Santiago de Compostela (2024). PresGC\_dia1.pdf. Recuperado de: https://cv.usc.es/mod/folder/view.php?id=1249111

05/02/2024 Página 14 de 18

## EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE CAMBIOS DEL OTRO EQUIPO:

Cambio propuesto	Valoración	Si/No
Integración de: Rechazo de la propuesta e información al usuario	Cambio directo	SI
Integración de: Revisión del desarrollo y realización del testeado	Cambio directo	SI
Descripción 2.3.1 incompleta	La redacción del apartado es inconsistente, por lo que la revisaremos y corregiremos.	SI
Usuario autorizado	En este caso, se entiende por usuario autorizado aquel que tiene acceso a toda la documentación del proyecto y ficheros del REM. Por tanto, consideramos que no es tanto cualquier usuario, sino aquellos que pueden tener alcanzable esta documentación.	NO
Plantilla "En blanco?"	Entendemos que estas dos propuestas hacen referencia al	
Productos del trabajo hace referencia a las salidas	mismo cambio, como productos de trabajo hace referencia a la salida de la actividad, debería ser la plantilla cubierta y no en blanco.	SI
2.3.3 – Evaluación del informe por el responsable de control	Se indica que falta la evaluación económica y temporal del cambio propuesto sobre la línea base, lo que puede ser una idea correcta: incluir en análisis coste-temporal para evaluar si se acepta o se rechaza. Por lo tanto, aunque entendíamos que estos análisis iban implícitos en la descripción dada, se indicará explícitamente para evitar confusión.	SI
2.3.4 – Faltan la ubicación de las plantillas	Es correcto, en nuestra memoria inicial no se hace referencia a las plantillas dentro de la carpeta, por lo que es necesario incluirlas de manera tácita. No obstante, se ha decidido incluir esta actividad (2.3.4) en la Evaluación del informe por el responsable del control.	SI
2.3.4 – 2.3.5 – Incluir ambas actividades en la misma	Se ha decidido incluir esta actividad en la Evaluación del informe por el responsable del control, por lo que es innecesario.	NO
2.3.6 – Descripción incompleta	Correcto. Revisaremos y completaremos la descripción.	SI
2.3.6 – Inserción del cambio en la cola	Sí, se trata de insertar en la cola de cambios en nuevo cambio que se ha transaccionado y aceptado. Nosotros indicamos como producto de trabajo la cola de prioridades, sin especificar la inserción del cambio.	SI
2.3.6.1 – Añadir cambio a la cola	Como en la descripción de la actividad misma se sobreentiende que se añade el cambio a la cola, no es necesario tener una subactividad, por lo que se elimina.	SI

		1
2.3.6.2 – General el OCI	Aunque ambas actividades van de la mano, son de naturalezas muy diferentes; por lo que consideramos que la diferenciación de generar el OCI como una subactividad aporta claridad a la actividad principal.	NO
2.3.7 - Clasificación de la actividad	No entendemos a qué se refiere este comentario.	NO
2.3.7 – Falta la ubicación de la plantilla	Plantilla: "plantillas/OCI/responsables"	SI
2.3.7 – Asignación debidamente cubierta	A pesar de que la plantilla en si existe, no se hace referencia a ella en la actividad, por lo que se necesita completar el criterio de salida.	SI
2.3.9-2.3.10 - Revisión y testeo como actividades conjuntas	Como se ha indicado anteriormente, estas dos actividades se unificarán, por lo que su definición cambiará completamente.	SI (pero ya aceptado antes)
2.3.12 - Distribución de la nueva versión e inclusión del cambio	En nuestra propuesta de cambio, hemos decidido incluir la actividad "Inclusión del cambio en la nueva versión" en el desarrollo del cambio. No obstante, consideramos que es una actividad de naturaleza muy diferente a la inclusión del cambio.	NO
Distribución – Falta indicar dónde se almacena la plantilla	Se nos ha pasado por alto indicar el lugar donde se almacenan las plantillas cubiertas.	SI
ID en las plantillas	Hace referencia al ID del cambio concreto al que corresponda la plantilla cubierta, ya cada documento tiene una posterior identificación con su nombre y con sus números de página correlativos. No obstante, consideramos que deberíamos especificar con mayor detalle en la justificación de campos.	SI
Incluir el nombre o ID del desarrollador que efectúa las revisiones de cara al seguimiento.	En cada plantilla se incluirán el nombre o nombres de los responsables de su cobertura para su posible posterior consulta.	SI
Referenciar ID del cambio inicialmente propuesto	Justificación en la propuesta: "ID en las plantillas".	SI (pero ya aceptado antes)
Referencia al cambio que causa el defecto	En el campo del ID se hace referencia al cambio concreto, esto va ligado a otros cambios propuestos con anterioridad.	SI (pero ya aceptado antes)
2.4.6.2 – Descripción incompleta	Incluir descripción: "fecha en la que se inicia la revisión del cambio / o testeado"	SI

## EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE CAMBIOS NUESTROS:

Cambio propuesto	Justificación
Eliminación de la actividad: Se rechaza la propuesta.	A la hora de definir la actividad, nos pareció que no es adecuado clasificarla como una actividad separada, sino que se incluye en el resultado de la evaluación del informe.
Añadir ubicación y dónde se debe almacenar cada plantilla.	Aunque en algunas ocasiones está especificado, en muchas actividades nos falta indicar dónde está disponible cada plantilla en blanco y dónde se almacenará una vez cubierta.
Cambio de nombre de la Actividad  Asignación de responsables de  objetos de  configuración	Consideramos que el título puede dar lugar a confusión y es demasiado extenso, por lo que optamos por reducirlo a Asignación de responsabilidades.
Cambio de nombre de la plantilla  Asignación de responsables de  objetos de  configuración	Consideramos que el nombre de la plantilla puede dar lugar a confusión y es demasiado extenso, por lo que optamos por reducirlo a Asignación de responsabilidades.
La actividad Inclusión del cambio en la nueva versión pasará a ser una subactividad del desarrollo.	Consideramos que fue un error realizar la inclusión de cambios una vez acabado el proceso de testeado ya que se pueden generar errores que no son comprobados, llevando a la distribución de un producto con fallos.
Eliminación del campo: dirección postal en las plantillas	Consideramos que es innecesaria la dirección postal puesto que el correo electrónico es más que suficiente como forma de contacto y de enviado de las plantillas.
Añadir ejemplos a las plantillas en cada campo	Se añadirán ejemplos de texto para indicar como se debe rellenar la plantilla, además de para añadir espacio de relleno en los campos en los que sea necesario ampliarlo.
Plantilla decisión tras evaluación: añadir campo "prioridad"	Se añadirá el campo "prioridad" para indicar la prioridad del cambio en función de su valor y coste.
